Jord-, Kloak-, Belægnings-, og Anlægsarbejde

Fredericia Shipping, Terminal Taulov

Hovedentreprise

Byggesag:
Opbygning af komplet containerterminal, inklusiv pakhus, kontor og værkstedsfaciliteter.
Forlængelse af jernbanespor ind i terminalen.
Der blev opbygget større arealer til ekstra tung trafik med udførelse af både kalk- og cementstabilisering.

Kloak m.m.:

Ø425 mm. nye brønde i plast	77 stk.
Ø600 mm. nye brønde i plast	5 stk.
Ø1000-Ø1500 mm. nye brønde i beton	17 stk.
Ø80-Ø160 drænledninger	8.390 m.
Ø160-Ø600 plastledninger	1.010 m.
Ø300-Ø1200 betonledninger	920 m.
Etablering af bygværker og olieudskillere	6 stk.

Belysning.:

El og lys master h: 8 til 24 m	31 stk.
Ø600 - Ø1300 Kabelbrønde	12 stk.
Div. El, fiber og trækrør	9.205 m.

Beliggenhed
Kongens Kvarter, 7000 Fredericia

Kontaktpersoner
FS Taulov ApS
Kontaktperson: Klaus Andersen
Tlf.: 40 14 22 25
Mail:
Klaus.G.Andersen@FredericiaSkipping.dk

Ingeniørfirmaet Læssøe-Simonsen A/S:
Kontaktperson: Preben Simonsen
Tlf.: 40 35 60 29
Mail: PrebenSim@Gmail.com

Byggeperiode
Opstart: 22.02.2018
Aflevering: 01.02.2021

Entrepriseform
Fagentreprise

Kontraktsum
53.900.500 DKK ekskl. moms – Heraf er ansøgers andel 100%

Entreprenør
Henning Have A/S
Vejen 7536 2911
Kolding 7550 4400

Engvej 13A
6600 Vejen

Firma tlf.: +45 75 36 29 11
www.hhave.dk

Jord-, Kloak-, Belægnings-, og anlægsarbejde

Fredericia Shipping, Terminal Taulov

Hovedentreprise

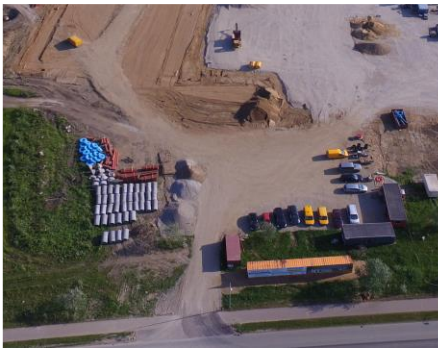
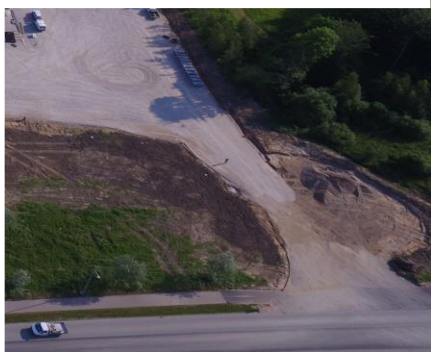

Jord og rydnings arbejder i hovedtal:

Opbrydning af div. Belægninger til bortskaffelse:	
Ekst. bevoksning:	11.500 m²
Kantsten:	250 lbm.
Asfalt:	100 ton
Jordhåndtering bortskaffelse eller genindbygge:	
Ren jord:	54.200 m³
Kartering:	1.500 ton
Kl. 2 jord:	500 ton
Levering og indbygning af materialer:	
Bundsikringssand:	38.645 m³
Stabil grus:	16.850 m³
Ballast skærver:	140 ton
Fed ler til dæmning:	1.500 m³
Kalkstabilisering:	93.800 m²
Cementstabilisering:	40.950 m²

Belægnings arbejder i hovedtal:

Asfalt varierende tykkelser:	550 m²
Coloc 9 cm. maskinsten:	76.530 m²
In-situ støbt vaskeplads:	480 m²
Kantsten lige, kurvede og special sten:	400 lbm.
Kantstøbning:	1.500 lbm.

Spor arbejder i hovedtal:

Bygning af Ballasteret spor:	165 lbm.
Dimensionering, levering og bygning af spor i in-situ støbt plade:	1.200 lbm.
Levering og indbygning af Betonsveller:	1.630 stk.
Levering og montage af sporskifte:	2 stk.
Levering og montage af sporstopper:	2 stk.

Beliggenhed
Kongens Kvarter, 7000 Fredericia

Kontaktpersoner
FS Taulov ApS
Kontaktperson: Klaus Andersen
Tlf.: 40 14 22 25
Mail:
Klaus.G.Andersen@FredericiaSkipping.dk

Ingeniørfirmaet Læssøe-Simonsen A/S:
Kontaktperson: Preben Simonsen
Tlf.: 40 35 60 29
Mail: PrebenSim@Gmail.com

Byggeperiode
Opstart: 22.02.2018
Aflevering: 01.02.2021

Entrepriseform
Fagentreprise

Kontraktsum
53.900.500 DKK ekskl. moms – Heraf er ansøgers andel 100%

Entreprenør
Henning Have A/S
Vejen 7536 2911
Kolding 7550 4400

Engvej 13A
6600 Vejen

Firma tlf.: +45 75 36 29 11
www.hhave.dk
